


【中川原橋(進捗状況)】

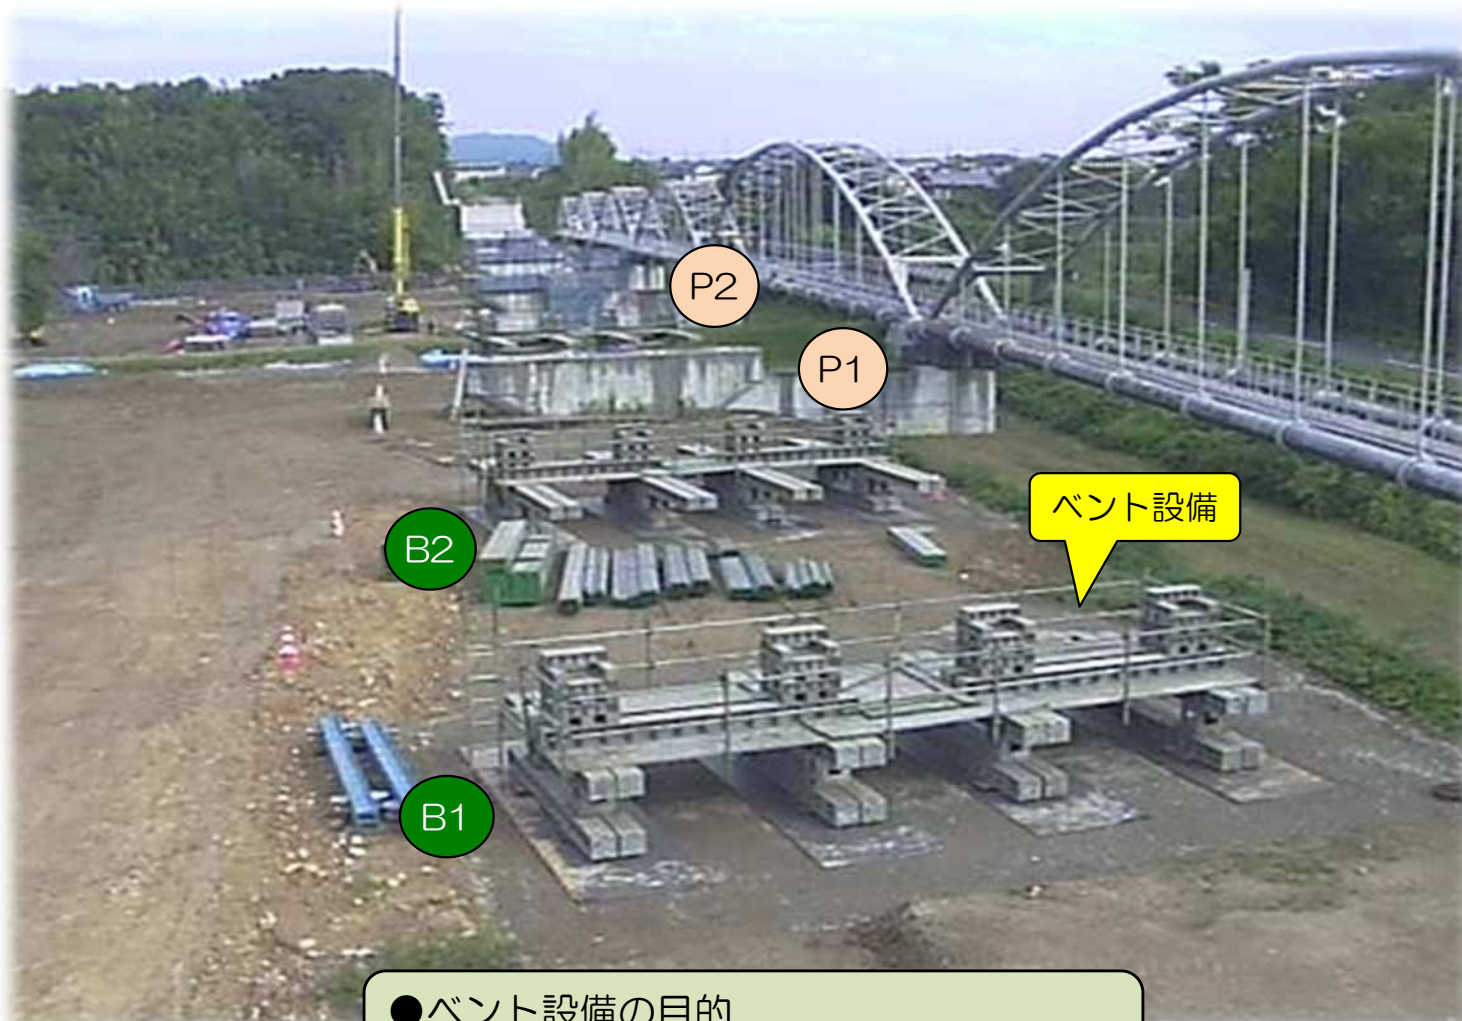

●仮締切工の目的
降雨により雲出川の水位が上昇した時の施工ヤードの浸水防止

●ベント設備の目的
架設作業を安全に効率よく進めるため

9月8日より現場着手し1ヶ月が過ぎました。

現在、①準備作業として大型土のう袋(2, 220袋)による雲出川の仮締切工 ②鋼桁架設のためのベント設備の組立を行っています。

11月から鋼桁の架設が始まります。

重量物を扱う高所作業が続きますので、朝礼・昼礼、休憩中などを利用し一人一人とコミュニケーションを図り安全意識を高く持って工事を進めます。

現場代理人:宮地 監理(主任)技術者:狩野・小川

