

- ・工事名：一般国道311号線(西の谷橋)橋梁補強工事
- ・発注者：熊野建設事務所
- ・社内工事番号：202519004

・進捗状況

昨年11月25日から現場に乗り込み、2ヶ月が経過しました。
この間足場組立が完了しアンカー削孔・定着についてもA1橋台側一部を除いて削孔・定着が完了しました。
現在、鉄面・Con面に型紙をあてての芯出し調整を行っています。
引き続き安全第一で作業を進めます。


<進捗状況>



足場組立完了



削孔長確認

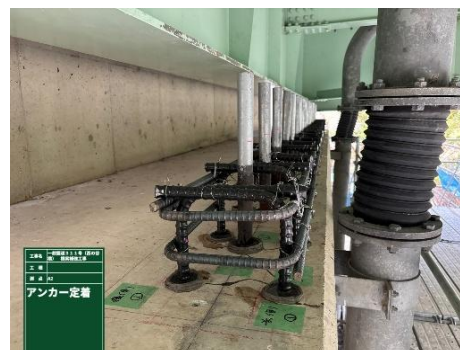

アンカー定着完了



芯出し・調整

現場代理人 山田

管理技術者 北川
