


江ノ浦大橋その8工事 近況報告【三重県北牟婁郡紀北町】

(支承取替工 マンホール及びハンドホール設置・ジャッキアップ補強部材取付部素地調整)

工事名：長島港(江ノ浦大橋)橋梁耐震補強工事(その8)
 客先：三重県 尾鷲建設事務所
 社内工事番号：202119006

橋脚支承取替補強詳細図

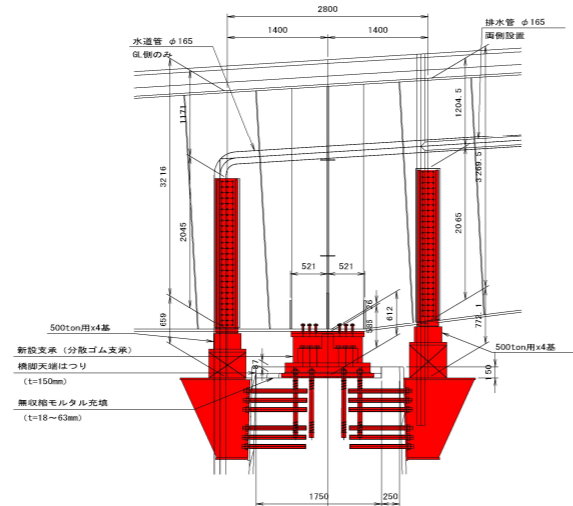


仮設吊足場及び昇降施設設置完了



ジャッキアップ受台及び作業構台アンカーボルト設置完了



マンホール及びハンドホール設置

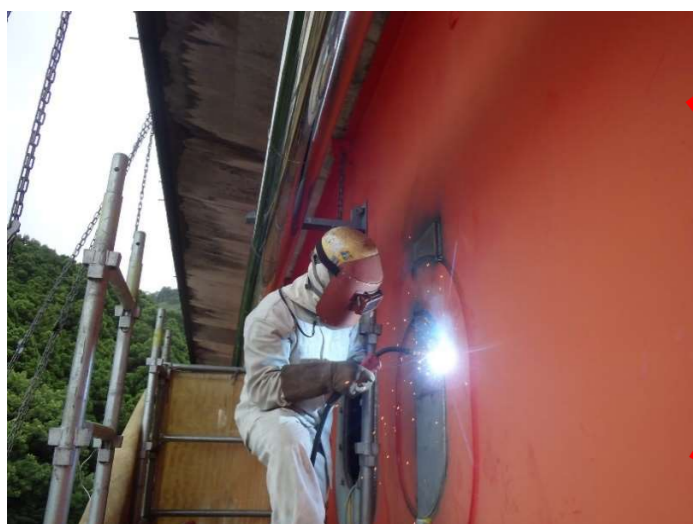

ボルト及び溶接で補強部材を接合

マンホール設置完了




ハンドホール設置完了



ジャッキアップ補強部材取付部素地調整



設置した、マンホール及びハンドホールで、給排気を行いながら、高温になる箱桁内作業になるため、冷却装置を設置し、作業環境の向上。

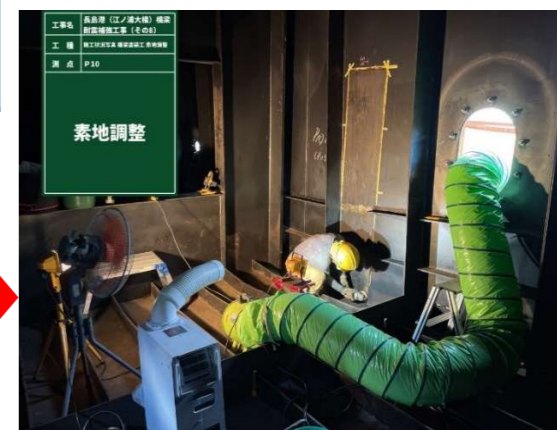

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGs 取り組み宣言

現場着手から4ヶ月が経過しましたが、現地調査の結果、協議及び工事変更事項多々あり当初工程より遅れを生じている状況ですが、協議事項も決定し遅れを取り戻すよう、安全第一で工事を進めています。また、マンホール及びハンドホールを設置したことにより、高温・埃・悪臭等で劣悪な環境であった箱桁内作業も、給排気出来るようになり作業環境を向上出来、熱中症対策としての冷却装置及び飲み物等の支給も行い、今後の猛暑を乗り越え、橋の下及び箱桁内の限られたスペースでの作業は、危険を伴い協力会社の皆さんと共に、より一層”安全第一・品質向上を確保した作業”に心掛けていきたいと思ひます。

現場代理人 西口
