


【中川原橋(鉄筋組立完了)】

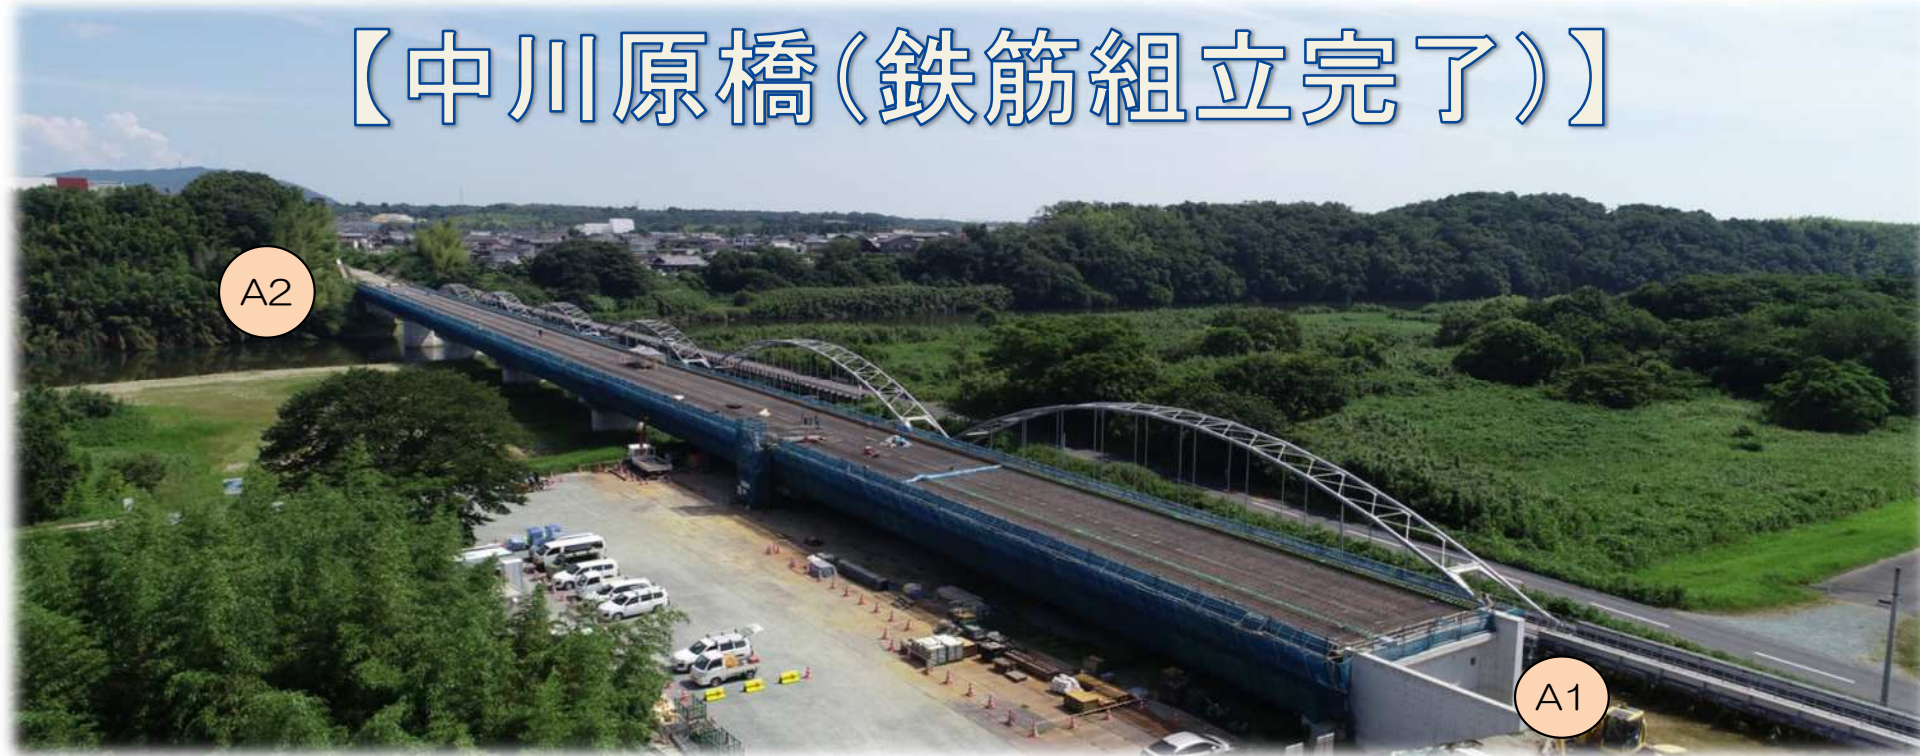

A2側より望む

休憩スペースの確保

鉄筋荷卸し



工事名 一般県道一志出家線(中川原橋)道路改良(橋梁上部工)工事
工種 安全管理写真
測点 A1
鉄筋荷卸し

社内型枠・配筋検査



工事名 一般県道一志出家線(中川原橋)道路改良(橋梁上部工)工事
工種 橋梁工
測点 C36(02-03)
社内検査
確認項目
(配筋検査:鉄筋間隔)
橋軸直角方向
桁間
設計値:2000
実測値:2010
社内検査員:赤塚

令和4年9月8日より現場着手し、概ね11ヶ月が過ぎました。
ようやく、床版・地覆の鉄筋組立が完了しました。8月から床版コンクリート打設を行います。
毎日、酷暑が続いていますが熱中症予防に努めながら、安全第一で工事を進めています。
現場代理人:宮地 監理(主任)技術者:狩野・小川 工事主任:ジャップ

