

5月の作業内容（橋面工）

沓座コンクリート打設



桁と橋台を繋ぐ「沓」をコンクリートで固定

- ① コンクリート（無収縮モルタル）を流し込む
- ② 水が溜まらないように勾配をつけてコテで仕上げる
- ③ 表面を仕上げて綺麗にし養生剤を塗布



別途、試験体で強度を確認
美観を大切に仕上げます
＊：縁の下（橋を支える）の力持ち

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGs 取り組み宣言



橋梁・水門・補修工事
宇野重工株式会社




橋面で付属物を設置する作業となっております。
安全作業で笑顔忘れず・・・ご安全に！

浜園橋：児玉（現場代理人）
上野（監理技術者）

鋼製排水溝・地覆組立据付

鋼製排水溝

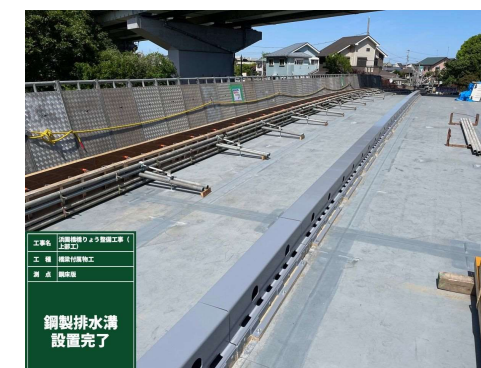

（部材を所定位置に配置～遮水性敷設材を敷設～据付～成形～完成）

地覆：鉄筋・型枠組立

（鉄筋組立・結束～型枠組立～位置確認）

